



LAPORAN PROJEK MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN (MBS)

20 NOVEMBER 2024



PROJEK 2024

RINGKASAN LAPORAN PROJEK 2024

PERUNTUKAN	BILANGAN PROJEK	JUMLAH PERUNTUKAN (RM)	STATUS				BELANJA	
			PERANCANGAN	PELAKSANAAN	SIAP	% SIAP	RM	%
MARRIS	205 (DETAIL A)	72,988,000.00	5 (DETAIL B)	85	115	56.10%	7,682,301.00	10.53%
KPKT	59	18,729,808.00	9	28	22	37.93%	644,616.30	3.63%
SUK								
UPEN	1	600,000.00	0	1	0	0%	0	0%
BKT	4	1,066,000.00	0	3	1	25.00%	0	0%
PPN	1	150,000.00	0	1	0	0%	0	0%
MEA (IKR)	-	-	-	-	-	-	-	-
MBS	38	11,760,500.00	9	12	17	44.73%	726,791.38	6.18%
JUMLAH	307	105,294,308.00	22	130	155	50.49%	9,053,708.68	8.68%

DETAIL A	
KATEGORI	BILANGAN
TENDER	5
SEBUTHARGA / LANTIKAN TERUS	101
UNDI	99

DETAIL B	
KATEGORI	BILANGAN
DOKUMEN SH/TENDER	2
TELAH IKLAN SH/TENDER	3
PROSES RUNDINGAN/ KELULUSAN PKN	0
PROSES LANTIKAN	0



MARRIS





MESYUARAT BIL. 3/2023

- Sebanyak **9 projek** telah diterima pada 22 Disember 2023

MESYUARAT BIL. 3/2023, 22.12.2023

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SEREMBAN JAYA, TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN	-	-	Penilaian tender
2.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN AST, SEREMBAN	Mula: 22.7.2024 Siap: 9.12.2024	838,790.00	90%
3.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA MELOR, SEREMBAN	Mula: 22.4.2024 Siap: 12.8.2024	490,036.00	100%
4.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN INDUSTRI RINGAN NILAM, JALAN RANTAU, SEREMBAN	Mula: 22.7.2024 Siap: 9.12.2024	549,520.00	50%
5.	CADANGAN MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG TAMAN DESA RASAH	Mula: 30.09.2024 Siap: 17.02.2025	780,380.00	60%
6.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PENUTUP LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN PINGGIRAN BAYU, MANTIN, NSDK.	Mula: 25.6.2024 Siap: 12.11.2024	2,833,300.00	45%
7.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NILAI SETIA, LABU, NSDK.	Mula: 6.5.2024 Siap: 26.8.2024	410,970.00	100%
8.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SENANGIN 17/1, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	Mula: 6.5.2024 Siap: 12.8.2024	424,740.00	100%
9.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NSV 1, NILAI SPRING VILLA, NILAI, NSDK	Mula: 01.08.2024 Siap: 19.12.2024	951,680.00	100%

KERJA UNDI FASA I/2024

- Diterima pada 27 Mac 2024
- Sebanyak **22 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM2,200,000.00**

KERJA UNDI FASA 1, 27.03.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN SRI MAWAR 13, TAMAN SRI MAWAR, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
2.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN MERAK 21, TAMAN PUNCA EMAS, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
3.	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ANGSAMAS, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
4.	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN DATO' SYEIKH MOHD MURTADZA, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
5.	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MURUGESU 1, TAMAN MURUGESU, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
6.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI PJ PERDANA SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 5.5.2024	100,000.00	100%
7.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN MARGOSA SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 5.5.2024	100,000.00	100%
8.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA RHU SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 5.5.2024	100,000.00	100%
9.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN EMAS KAWASAN INDUSTRI NILAI, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%

KERJA UNDI FASA 1, 27.03.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
10.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
11.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SENAWANG 8, TAMAN SERI PAGI SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
12.	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN JALAN DI TAMAN SRI PULASAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 5.5.2024	100,000.00	100%
13.	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN PERMATA RANTAU SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
14.	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI TAMAN LIAN DAN YANG BERHAMPIRAN RASAH SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
15.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN MERAK 19, TAMAN PUNCA EMAS, SEREMBAN	Mula: 11.3.2024 Siap: 3.6.2024	100,000.00	100%
16.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH, NILAI, NSDK	Mula: 23.03.2024 Siap: 16.05.2024	99,315.28	100%
17.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA JATI, NILAI, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	99,732.10	100%
18.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI MELATI SQUARE, NILAI, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	99,933.52	100%

KERJA UNDI FASA 1, 27.03.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
19.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DAN PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ALBURY 1, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	100,000.00	100%
20.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UTAMA TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	99,994.68	100%
21.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GADONG JAYA 14, TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	99,995.40	100%
22.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GADONG INDAH 9, TAMAN GADONG INDAH, LABU, NSDK	Mula: 21.3.2024 Siap: 16.5.2024	99,997.40	100%



MESYUARAT BIL. I/2024

- Sebanyak **12 projek** telah diterima

MESYUARAT BIL. 1/2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MENYELENGGARA CERUN SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT LEMON BERHAMPIRAN SJK(C) CHUNG HUA, SEREMBAN	-	-	Penyediaan dokumen sebutharga
2.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KELILING, SEREMBAN	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%
3.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BELATEK 4, TAMAN HARAPAN BARU	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%
4.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SENAWANG 3 DAN LORONG SENAWANG 3/2, SENAWANG, NEGERI SEMBILAN	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%
5.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN RASAH UTAMA 1, TAMAN RASAH JAYA	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%
6.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN LILY 1 DAN JALAN LILY 2, TAMAN LILY, SEREMBAN	Mula: 1.7.2024 TAMAT : 5.8.2024	180,400.00	100%
7.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN MATAHARI 2 DAN JALAN MATAHARI HEIGHTS 1/1, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%

MESYUARAT BIL. 1/2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
8.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUANKU MUNAWIR, JALAN PASAR BESAR, JALAN PASAR BESAR 1, JALAN UTAM SINGH DAN JALAN UTAMA PASAR (PASAR BESAR SEREMBAN), MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 6.6.2024 Siap: 19.6.2024	50,000.00	100%
9.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI GADING, MANTIN, NSDK	Mula: 9.9.2024 Siap: 30.12.2024	188,580.00	35%
10.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN NILAI DAN KG. BARU NILAI, NILAI, NSDK	Mula: 9.9.2024 Siap: 2.12.2024	290,315.00	90%
11.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN ULU BERANANG, LENGGENG, NSDK	Mula: 9.9.2024 Siap: 2.12.2024	184,680.00	45%
12.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 6/1R, DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK	Mula: 9.9.2024 Siap: 2.12.2024	289,800.00	90%



KERJA UNDI FASA 2/2024

- Diterima pada 11 Jun 2024
- Sebanyak **44 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM4,400,000.00**

KERJA UNDI FASA 2, 11.06.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	CADANGAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN JAMBU 3, TAMAN SG. UJONG, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
2.	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN DESA MELOR 10, TAMAN DESA MELOR	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
3.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	90%
4.	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN RK 3/3, RASAH KEMAYAN FASA 3, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
5.	MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN ROS MERAH 5 DAN JALAN ROS MERAH 1, TAMAN KOBENA	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
6.	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN MATAHARI INDAH 6/1, TAMAN MATAHARI INDAH, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
7.	MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SELASIH 13, KAMPUNG SENTOSA, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
8.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI AVIVA GREEN, MBS	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
9.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN SRI MAWAR, TAMAN SRI MAWAR	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%

KERJA UNDI FASA 2, 11.06.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
10.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA RAYA, KUALA SAWAH, RANTAU	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
11.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN KOPERASI KUALA SAWAH, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
12.	CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN KBM 14, KG. BARU MAMBAU, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
13.	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA YANG BERKAITAN DI TAMAN LUCKY DAN YANG BERHAMPIRAN, RASAH	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	40%
14.	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN YANG BERAKITAN DI TAMAN BUKIT KELISA, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
15.	MENYELENGGARA LONGKANG DAN YANG BERKAITAN DI JALAN KURAU 1, TAMAN PERMAI, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
16.	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN SELASIH 5, KAMPUNG SENTOSA JAYA,S EREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
17.	KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU RAHANG, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
18.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN ZAMRUD 5, TAMAN KOOP, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%

KERJA UNDI FASA 2, 11.06.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
19.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. DATO' MOHD SAID, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
20.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN JUJUR, TAMAN JUJUR, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
21.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMBUSU 3, TAMAN CENGAN UTAMA, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
22.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JASPER JAYA, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
23.	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN PANCHOR JAYA FASA 4	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
24.	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI TELAWI, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
25.	KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN AMPANGAN, SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
26.	CADANGAN MENYELENGGARA BONGGOL JALAN SERTA KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAY SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
27.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO (TEBING ANTARA TAMAN DAN JALAN TUANKU ANTAH / JALAN LINGKARAN TENGAH) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN 9, TAMAN BIDARA, MBS	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%

KERJA UNDI FASA 2, 11.06.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
28.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO (TEBING FLAT DAHLIA) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI LORONG S2 G24 DAN S2 G24/2, GARDEN AVENUE, MBS	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
29.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN AMENITI BERISIKO SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN TEKNOLOGI, KAWASAN PERINDUSTRIAN BANDAR ENSTEK, DI DALAM KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
30.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESARIA, NILAI, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
31.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA MELATI, NILAI, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 11.7.2024 Siap: 3.10.2024	100,000.00	100%
32.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN UB 3, TAMAN ULU BERANANG, LENGGENG, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
33.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GADONG JAYA 28/8, TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
34.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG PEKAN LENGGENG, LENGGENG, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
35.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG PEKAN ULU BERANANG, LENGGENG, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 19.9.2024	100,000.00	100%
36.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN PERBANDARAN, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%

KERJA UNDI FASA 2, 11.06.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
37.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI NILAI SQUARE, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
38.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN BBN 6/2B, TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
39.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 1/6B PUTRA POINT, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
40.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN GADONG JAYA 28, TAMAN GADONG JAYA, LABU, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
41.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESARIA, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
42.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN IMPIANA VILLA, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
43.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KEDAI TAMAN ASOKA, MANTIN, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%
44.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN DESA KOLEJ, NILAI, NSDK	Mula: 11.7.2024 Siap: 5.9.2024	100,000.00	100%

MESYUARAT BIL. 2/2024

- Diterima pada 19 Julai 2024
- Sebanyak **45 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM14,360,000.00**

MESYUARAT BIL. 2/2024, 19.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA RISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SRI MAWAR 6 DAN 7, TAMAN SRI MAWAR, MBS	Mula: 9.9.2024 Siap: 21.10.2024	181,100.00	100%
2.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA (TEPI JALAN) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RJ 1/5 DAN RJ 1/6, TAMAN RASAH JAYA, MBS	Mula: 9.9.2024 Siap: 21.10.2024	92,030.00	100%
3.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SEMARAK 1, TAMAN PANCHOR JAYA	Mula: 19.8.2024 Siap: 16.9.2024	50,000.00	100%
4.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA (TEBING JALAN DALAM TAMAN BUKIT EMAS BERSEBELAHAN DENGAN JPJ SEREMBAN) DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BUKIT EMAS 1 DAN JALAN BUKIT EMAS 4, TAMAN BUKIT EMAS, MBS	Mula: 9.9.2024 Siap: 30.12.2024	449,850.00	80%
5.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RJ 1/4 SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN RASAH JAYA, MBS	Mula: 24.9.2024 Siap: 5.11.2024	91,000.00	100%
6.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI 2/1, TAMAN RASAH JAYA, MBS	Mula: 9.9.2024 Siap: 21.10.2024	93,200.00	100%
7.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI GREEN STREET HOMES, MBS	Mula: 9.9.2024 Siap: 21.10.2024	95,170.00	100%
8.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA BERISIKO DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN BUNGA TANJUNG 1, TAMAN TASIK JAYA	Mula: 9.9.2024 Siap: 21.10.2024	92,480.00	100%
9.	KERJA-KERJA CANTASAN DAN MENEBANG POKOK AMENITI BERISIKO DI KAWASAN TAMAN GADONG INDAH, MUKIM LABU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 18.9.2024 Siap: 8.10.2024	50,000.00	100%

MESYUARAT BIL. 2/2024, 19.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
10.	KERJA-KERJA CANTASAN DAN MENEBAK POKOK AMENITI BERISIKO DI KAWASAN TAMAN GADONG PUTRA, MUKIM LABU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 18.9.2024 Siap: 8.10.2024	50,000.00	100%
11.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN CEMPAKA 2, TAMAN CEMPAKA, MBS	Mula: 19.8.2024 Siap: 16.9.2024	50,000.00	100%
12.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN SUSUR KE TAMAN TUANKU JAAFAR, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 19.8.2024 Siap: 16.9.2024	50,000.00	100%
13.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TUAN HAJI SAID, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 19.8.2024 Siap: 16.9.2024	50,000.00	100%
14.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN LEE SIEW JOO, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 19.8.2024 Siap: 16.9.2024	50,000.00	100%
15.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN SENAWANG, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 20.01.2025	489,101.00	0%
16.	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN KING WONG, SEREMBAN	-	-	Iklan ditutup pada 04.11.2024
17.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEREMBAN JAYA FASA 5, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 20.01.2025	485,570.00	0%
18.	MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA BERKAITAN DI TAMAN BUNGA BLOSSOM, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 20.01.2025	483,231.00	0%

MESYUARAT BIL. 2/2024, 19.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
19.	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. BARU SIKAMAT, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 19.1.2025	396,155.00	0%
20.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERINDUSTRIAN GALLA 14, SEREMBAN	Mula: 16.12.2024 Siap: 23.02.2024	193,980.00	0%
21.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KG CHEDANG 1 (DEPAN MASJID JAMEK DATO' BANDAR HAJI AHMAD RASAH), SEREMBAN	-	-	Penyediaan dokumen sebuttharga
22.	CADANGAN KERJA-KERJA MENYELENGGARA SISTEM LAMPU JALAN DI LINTANG – JALAN LABU LAMA, SEREMBAN, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 23.9.2024 Siap: 16.12.2024	415,910.00	60%
23.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DI JALAN SEROJA 16 – PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 23.9.2024 Siap: 2.12.2024	489,830.00	70%
24.	CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DI TAMAN KOMERSIAL CEMPAKA, SENAWANG, MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 23.9.2024 Siap: 2.12.2024	471,065.00	60%
25.	MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN LAYANG-LAYANG, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 20.1.2025	492,750.00	0%
26.	MENURAP JALAN DAN KERJA YANG BERKAITAN DI GARDEN AVENUE SEREMBAN 2, SEREMBAN	Mula: 25.9.2024 Siap: 4.12.2024	490,240.00	50%
27.	MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN LUCKY, JALAN RASAH, SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 3.2.2025	155,690.00	0%

MESYUARAT BIL. 2/2024, 19.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
28.	MENYELENGGARA GARISAN JALAN DI SENDAYAN TECHVALLEY, SENDAYAN, SEREMBAN	Mula: 2.9.2024 Siap: 23.12.2024	475,267.50	95%
29.	KERJA-KREJA MEMBEKAL DAN MEMASANG GUARDRAIL SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN SRI RAMAI, RANTAU, NEGERI SEMBILAN	Mula: 2.9.2024 Siap: 25.11.2024	93,115.00	100%
30.	KERJA-KERJA CANTASAN DAN MENEBAK POKOK AMENITI BERISIKO DI KAWASAN TAMAN ALBURY 1, MUKIM LENGGENG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN, KAWASAN MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 18.9.2024 Siap: 8.10.2024	50,000.00	100%
31.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN TASIK SENANGIN 2, BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NSDK	Mula: 1.10.2024 Siap: 26.11.2024	485,562.00	15%
32.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SERAYA, MANTIN, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	485,110.00	0%
33.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TS 2/3, TAMAN SEMARAK, NILAI, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	482,306.00	0%
34.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KG. BARU SRI LABU, LABU, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	483,720.00	0%
35.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN LABU INDAH, LABU, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	481,638.00	0%
36.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PERSADA AMAN, BANDARA ENSTEK, NSDK	Mula: 8.11.2024 Siap: 3.01.2025	481,710.00	0%

MESYUARAT BIL. 2/2024, 19.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
37.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NILAI 3/20, KAWASAN PERINDUSTRIAN NILAI 3, NILAI, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	481,682.00	0%
38.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUKIT KEMUNING, MANTIN, NSDK	Mula: 8.11.2024 Siap: 3.01.2025	470,328.00	0%
39.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN PINGGIRAN MARKISA, LABU, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	184,880.00	0%
40.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BUNGA RAYA, MANTIN, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	468,826.00	0%
41.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN BBN 1/7, NILAI, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	487,110.00	0%
42.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN KLANA JAYA DAN RUMAH RAKYAT LENGGENG, LENGGENG, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	483,908.00	0%
43.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN SRI KLEDANG, MANTIN, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	470,600.00	0%
44.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN DESA KOLEJ, TAMAN DESA KOLEJ, NILAI, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	462,435.00	0%
45.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN EMAS 1, NILAI, NSDK	Mula: 1.11.2024 Siap: 27.12.2024	478,110.00	0%

KERJA UNDI FASA 3/2024

- Diterima pada 21 Ogos 2024
- Sebanyak **33 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM330,000.00**

KERJA UNDI FASA 3, 21.08.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	KERJA-KERJA MENYELENGGARA BONGGOL JALAN SERTA KERJA BERKAITAN BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	20%
2.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2H19, PARK AVENUE (FASA 1), MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
3.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN S2G2, GARDEN AVENUE (FASA 1), MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
4.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN HIJAYU 1, 2 & 3, BANDAR SRI SENDAYAN, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
5.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN NUSARI 1, BANDAR SRI SENDAYAN, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
6.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN PERBANDARAN, BANDAR BARU NILAI, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
7.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARISAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BP 5 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	85%
8.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARISAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BP 4 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
9.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARISAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BP 3 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	85%

KERJA UNDI FASA 3, 21.08.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
10.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARISAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BP 2 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
11.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARISAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KAWASAN BP 1 BAGI MAJLIS BANDARAYA SEREMBAN	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
12.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN RIMBUN IMPIAN (FASA 1), MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
13.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN HARUAN 2 (FASA 1), OAKLAND COMMERCIAL CENTRE, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
14.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK UTAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN MERAK (DEPAN MASJID PAROI JAYA), TAMAN PAROI JAYA, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
15.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN SAUJANA IMPIAN (FASA 1), MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
16.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK TEDUHAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI IDAMAN VILLA, BANDAR SRI SENDAYAN, MBS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
17.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN TAMAN DESARIA, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
18.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN PERSIARAN PERDANA, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%

KERJA UNDI FASA 3, 21.08.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
19.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI INDUSTRI NILAI 7, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
20.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA CEMPAKA, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
21.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA INDAH, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
22.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA JASMIN, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
23.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN SEMARAK, NILAI, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
24.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
25.	KERJA PEMBAIKAN PERABOT JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
26.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI PERSADA MURNI, ENSTEK, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
27.	KERJA PEMBAIKAN HANDRAILING SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN GADONG JAYA, LABU, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%

KERJA UNDI FASA 3, 21.08.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
28.	KERJA PEMBAIKAN JALAN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI LOT KEDAI MERCATO, ENSTEK, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
29.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN ANDALAS, MANTIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
30.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN DESA, TAMAN KENANGA DAN TAMAN BUKIT SAGA, MANTIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
31.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI BANDAR TASIK SENANGIN, LENGGENG, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%
32.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN KLANA JAYA, LENGGENG, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	80%
33.	KERJA PEMBAIKAN LONGKANG DAN TEMBOK LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN ASOKA DAN TAMAN MANTIN, MANTIN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	Mula: 13.9.2024 Siap: 8.11.2024	100,000.00	100%

KERJA RUNDINGAN TERUS DI BAWAH NEGERI ROADSTONE SDN. BHD. (NRSB)

- Sebanyak **14 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM40,903,000.00**

RUNDINGAN TERUS NRSB

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN BAIDURI 10/1, TAMAN CHIP AIK, SERMEBAN, NEGERI SEMBILAN (LOKASI 1 & LOKASI 3) (REKA DAN BINA)	Mula: 09.12.2024 Siap: 08.08.2025	3,500,000.00	0%
2.	KERJA MEMBAIKPULIH CERUN RUNTUH DI JALAN DESA DAHLIA 2, TAMAN DESA DAHLIA, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (FASA 2) (REKA DAN BINA)	Mula: 16.12.2024 Siap: 15.12.2025	3,110,000.00	0%
3.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA MUTIARA GALLA, PERSIARAN S2/2 DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 25.11.2024 Siap: 24.01.2025	1,340,000.00	0%
4.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA BUKIT GALENA DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 18.11.2024 Siap: 17.01.2025	1,900,000.00	0%
5.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUSAHAAN SENAWANG BARU DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 10.02.2025	3,860,000.00	0%
6.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN UTAMA RASAH 1 & 2 DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 11.01.2025	760,000.00	0%
7.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN SIKAMAT DI DAERAH SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 02.12.2024 Siap: 02.02.2025	1,250,000.00	0%

RUNDINGAN TERUS NRSB

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
8.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI TAMAN CEMPAKA DAN TAMAN DESA MELATI FASA 3, DAERAH SEREMBAN	Mula: 23.01.2024 Siap: 22.09.2024	2,203,000.00	100%	
9.	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH STRUKTUR PENAMPAN JAMBATAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN MUTIARA, NILAI 3, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS (REKA DAN BINA)	Mula: 23.10.2024 Siap: 04.06.2025	1,650,000.00	10%	
10.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN ARAB – MALAYSIAN, NILAI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 17.10.2024 Siap: 17.02.2025	4,380,000.00	10%	
11.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN ILMU, NILAI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 17.10.2024 Siap: 17.01.2025	2,190,000.00	10%	
12.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN BANDARAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN KORPORAT, NILAI, NEGERI SEMBILAN	Mula: 21.10.2024 Siap: 21.01.2025	3,565,000.00	10%	
13.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN TS UTAMA, NILAI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 21.10.2024 Siap: 21.03.2025	788,000.00	10%	
14.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN NILAI 7, NILAI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN	Mula: 21.10.2024 Siap: 21.10.2025	7,595,000.00	10%	

KERJA-KERJA KECEMASAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS) BAGI KERJA- KERJA PEMBAIKAN KECIL

- Sebanyak **26** projek telah dilaksanakan dengan jumlah peruntukan yang digunakan sebanyak **RM1,164,000.00**

KERJA-KERJA KECEMASAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS) BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI MEDAN PERNIAGAAN OAKLAND, MBS	Mula: 23.10.2024 Siap: 30.10.2024	25,000.00	100%	
2.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI PERSIARAN SENAWANG 7, TAMAN SERI PAGI, MBS	Mula: 23.10.2024 Siap: 30.10.202	35,000.00	100%	
3.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI JALAN BSS 1 DAN BSS 1/4 , BUKIT SRI SENAWANG, MBS	Mula: 23.10.2024 Siap: 30.10.202	40,000.00	100%	
4.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI PERSIARAN RAJAWALI, TAMAN PAROI JAYA, MBS	Mula: 23.10.2024 Siap: 30.10.202	40,000.00	100%	
5.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI PERSIARAN FOREST HEIGHTS 1, SEREMBAN, MBS	Mula: 23.10.2024 Siap: 30.10.202	50,000.00	100%	
6.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO TEPI TEBING NO 79, TAMAN ZAITON (BERSEBELAHAN JALAN UTAMA SIKAMAT), MBS	Mula: 30.10.2024 Siap: 6.11.2024	50,000.00	100%	
7.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI TEPI LOT 193 JALAN SIKAMAT, SEREMBAN, MBS	Mula: 30.10.2024 Siap: 6.11.2024	30,000.00	100%	

KERJA-KERJA KECEMASAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS) BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
8.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI JALAN MUFTI AHMAD, SEREMBAN, MBS	Mula: 5.11.2024 Siap: 12.11.2024	20,000.00	90%	
9.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI PERSIARAN SENAWANG 1, SENAWANG 2 DAN TAMAN SATRIA, MBS	Mula: 5.11.2024 Siap: 12.11.2024	50,000.00	90%	
10.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI PERSIARAN TASIK SENANGIN 1, PERSIARAN TASIK SENANGIN 2 DAN JALAN TASIK SENANGIN 8, LENGGENG, MBS	Mula: 5.11.2024 Siap: 12.11.2024	24,000.00	90%	
11.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI KILANG SKF DAN JALAN TAMAN SEMARAK 1/6, BANDAR BARU NILAI, MBS	Mula: 5.11.2024 Siap: 12.11.2024	50,000.00	90%	
12.	Kerja Penyelenggaraan Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Persiaran S2/E1 Garden Homes Fasa E Seremban 2	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
13.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Serta Kerja berkaitan Di Taman Angsammas Fasa 1 Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap:	50,000.00	5%	

KERJA-KERJA KECEMASAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS) BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
15.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan SJ 9/2, Taman Seremban Jaya, Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
16.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Jalan TJ 2/3, Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
17.	Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Lorong Bukit Kelisa 3/2, Taman Bukit Kelisa Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
18.	Kerja Penyelenggaraan railing dan guardrail di Jalan Lobak BP1 bagi Majlis Bandaraya Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
19.	Kerja Penyelenggaraan railing dan guardrail di Taman Thivy Jaya dan Taman Arowana Indah BP 2 bagi Majlis Bandaraya Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
20.	Kerja Penyelenggaraan railing dan guardrail di jalan seremaban jaya BP3 bagi Majlis Bandaraya Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap:	50,000.00	5%	

KERJA-KERJA KECEMASAN PENYELENGGARAAN JALAN RAYA NEGERI (MARRIS) BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
22.	Kerja Pembaikan Longkang dan Tembok Longkang Serta Kerja Berkaitan di Taman Dato Shahardin, Labu	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
23.	Kerja Pembaikan Longkang dan Tembok Longkang Serta Kerja Berkaitan di Taman Gadong Jaya, Labu	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
24.	Kerja Pembaikan Longkang dan Tembok Longkang Serta Kerja Berkaitan di Taman Bunga Raya, Mantin	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
25.	Kerja Penyelenggaraan railing dan guardrail di Jalan BBN 6/1G Nilai Bandar Baru Nilai bagi Majlis Bandaraya Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
26.	Kerja penyelenggaraan railing dan guardrail di Jalan TS 2/1 Taman Semarak Nilai bagi Majlis Bandaraya Seremban	Mula: 6.11.2024 Siap: 26.11.2024	50,000.00	5%	
	- Sila isikan sekiranya ada projek baru -				



KPKT

TPPM (DE)

- Diterima pada 14 Februari 2024
- Sebanyak **9 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM1,550,000.00**

TPPM (DE), 14.02.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	MENAIKTARAF SISTEM RETIKULASI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI APARTMENT CEMPAKA 1	Mula: 29.5.2024 Siap: 21.8.2024	187,768.00	100%	100%
2.	MENAIKTARAF SISTEM RETIKULASI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI APARTMENT IXORA, S2	Mula: 15.5.2024 Siap: 26.6.2024	40,000.00	100%	100%
3.	MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN MAKMUR	Mula: 29.5.2024 Siap: 16.9.2024	325,000.00	100%	100%
4.	KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI FLAT TAMAN BUKIT NIBONG	Mula: 29.5.2024 Siap: 16.9.2024	115,800.00	100%	100%
5.	MENAIKTARAF HARTA BERSAMA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI KOS RENDAH MATAHARI HEIGHTS	Mula: 29.5.2024 Siap: 7.8.2024	117,088.00	100%	100%
6.	MENAIKTARAF PAIP SANITARI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI TAMAN NILAI 3 BLOK A	Mula: 13.08.2024 Siap: 5.11.2024	181,000.00	100%	Dalam proses bayaran 50%
7.	MENAIKTARAF PAIP RETIKULASI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI RUMAH PANGSA RAKYAT PAJAM	Mula: 5.6.2024 Siap: 21.8.2024	204,330.00	100%	Dalam proses bayaran 100%
8.	MENAIKTARAF CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI NILAI PERDANA	Mula: 2.7.2024 Siap: 24.09.2024	141,650.00	100%	Dalam proses bayaran 100%
9.	MEMBAIK PULIH BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI CEMPAKAPURI FASA 1&2	Mula: 2.7.2024 Siap: 24.09.2024	188,577.00	100%	Dalam proses bayaran 50%

TPPM: INISIATIF BELANJAWAN 2024 – LIF MADANI 2.0

- Diterima pada 13 Mac 2024
- Sebanyak **7 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM3,850,000.00**

TPPM (LIF MADANI 2.0), 13.03.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK A & B, APARTMENT CASA PRIMA	Mula: 27.06.2024 Siap: 11.06.2025	740,500.00	10%	
2.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 2 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK C & D, APARTMENT CASA PRIMA	Mula: 27.06.2024 Siap: 11.06.2025	751,500.00	10%	
3.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK A, APARTMENT TAMAN SEREMBAN PUTRA	Mula: 27.06.2024 Siap: 28.05.2025	360,000.00	8%	
4.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK B, APARTMENT TAMAN SEREMBAN PUTRA	Mula: 27.06.2024 Siap: 28.05.2025	360,000.00	8%	
5.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK D, APARTMENT TAMAN SEREMBAN PUTRA	Mula: 27.06.2024 Siap: 28.05.2025	360,000.00	8%	
6.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK E, APARTMENT TAMAN SEREMBAN PUTRA	Mula: 27.06.2024 Siap: 28.05.2025	360,000.00	8%	
7.	KERJA-KERJA PENGGANTIAN 1 UNIT LIF DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK F, APARTMENT TAMAN SEREMBAN PUTRA	Mula: 27.06.2024 Siap: 28.05.2025	360,000.00	8%	

PPP

- Diterima pada 26 Mac 2024
- Sebanyak **10 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM2,638,350.00**

PPP, 26.03.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	KERJA-KERJA MENGGANTI TANGKI AIR SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK	Mula: 19.07.2024 Siap: 11.10.2024	123,300.00	100%	Proses bayaran 50%
2.	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN HARTA BERSAMA (BAIKPULIH TAMAN PERMAINAN & GELANGANG) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK	Mula: 15.07.2024 Siap: 09.09.2024	79,025.00	100%	Permohonan EFT ke 2 telah di hantar
3.	KERJA-KERJA MENGGANTI PAIP RETIKULASI SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK	Mula: 20.09.2024 Siap: 23.12.2024	337,293.00	90%	Proses bayaran 50%
4.	KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK SISTEM PEPASANGAN ELEKTRIK SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK	Mula: 23.09.2024 Siap: 02.12.2024	339,385.00	70%	
5.	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN HARTA BERSAMA (BAIKPULIH KEROSAKAN 20 UNIT RUMAH) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PPRT LOBAK	Mula: 19.07.2024 Siap: 08.11.2024	218,159.00	70%	Proses bayaran 50%
6.	KERJA-KERJA MENGGANTI MOTOR PAM SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI RAKYAT SERI PERDANA PPR PAROI	Mula: 27.05.2023 Siap: 23.06.2023	48,572.00	100%	100%

PPP, 26.03.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
7.	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN HARTA BERSAMA (MEMBAIKPULIH SISTEM KUMBAHAN) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI PERDANA PPR PAROI	Mula: 06.11.2024 Siap: 01.01.2025	64,850.00	0%	
8.	KERJA-KERJA MEMBINA TEMBOK BATA, MEMASANG JARING DI BALKONI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PANGSAPURI RAKYAT SERI PERDANA PPR PAROI	Mula: 24.06.2024 Siap: 16.09.2024	293,910.00	100%	
9.	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN HARTA BERSAMA (MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI PERDANA PPR PAROI	Mula: 19.07.2024 Siap: 08.11.2024	898,750.00	40%	
10.	KERJA-KERJA MEMBAIKI KEROSAKAN HARTA BERSAMA (MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN LONGKANG) SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PANGSAPURI SERI PERDANA PPR PAROI	Mula: 08.07.2024 Siap: 28.10.2024	85,735.00	100%	Proses bayaran 50%

BP.I (SENARAI I/2024)

- Diterima pada 5 Mac 2024
- Sebanyak **4 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM2,100,000.00**

BP.1 (SENARAI 1/2024), 05.03.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN KEPADA JENIS LED SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN TUN DR ISMAIL	Mula: 13.5.2024 Siap: 5.8.2024	393,690.00	100%	-
2.	MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI MEDAN SELERA BATU 4 ½, JALAN SEREMBAN – TAMPIN	Mula: 13.5.2024 Siap: 1.9.2024	290,660.00	100%	-
3.	MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI GERAJ KRAFTANGAN, JALAN DATO' HAMZAH	Mula: 13.5.2024 Siap: 1.9.2024 EOT 1: 22.9.2024	486,880.00	100%	-
4.	MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI GERAJ PENDIDIKAN, JALAN DATO' HAMZAH	Mula: 13.5.2024 Siap: 1.9.2024 EOT 1: 22.9.2024	484,470.00	100%	-

BP.I (SENARAI 3/2024)

- Diterima pada 15 April 2024
- Sebanyak **2 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM700,000.00**

BP.1 (SENARAI 3/2024), 15.04.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
EARLY ADOPTER - PLANM					
1.	CADANGAN PEMBANGUNAN SMART TRAFFIC LIGHT DI JAJARAN JALAN SEREMBAN JAYA (JALAN PERBANDARAN)	Mula: 17.6.2024 Siap: 10.8.2024	196,455.00	100%	-
LAIN-LAIN					
2.	PEMBINAAN PINTU GERBANG DAN LAMPU HIASAN JALAN LEE FONG YEE	Mula: 15.7.2024 Siap: 7.10.2024 EOT: 4.11.2024	491,890.00	100%	47%

BP.I (SENARAI 4/2024)

- Diterima pada 13 Mei 2024
- Sebanyak **8 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM2,700,000.00**

BP.1 (SENARAI 4/2024), 13.05.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
PASAR AWAM – P10					
1.	KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN AM DAN ELEKTRIK DI BANGUNAN PASAR RANTAU, MB SEREMBAN	Mula: 5.8.2024 Siap: 24.11.2024	645,565.00	50%	
2.	MENAIKTARAF BANGUNAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PASAR SEREMBAN JAYA, MB SEREMBAN	Mula: 5.8.2024 Siap: 10.11.2024 EOT: 24.11.202	488,050.00	50%	
KIOSK – P43001000142401					
1.	KIOSK BANDAR TASIK SENANGIN, MB SEREMBAN	Mula: 12.8.2024 Siap: 4.11.2024 (LAD)	245,100.00	60%	
2.	KIOSK BANDAR SERIEMAS, MB SEREMBAN	Mula: 12.8.2024 Siap: 4.11.2024 EOT: 16.12.2024	244,660.00	60%	
3.	KIOSK PEKAN LABU, MB SEREMBAN	Mula: 12.8.2024 Siap: 4.11.2024 EOT: 16.12.2024	245,755.00	60%	
4.	KIOSK PEKAN RANTAU, MB SEREMBAN	Mula: 5.8.2024 Siap: 25.11.2024	247,230.00	70%	
5.	KIOSK BANDAR BARU NILAI, MB SEREMBAN	Mula: 12.8.2024 Siap: 4.11.2024	246,910.00	100%	
6.	KIOSK PEKAN MANTIN, MB SEREMBAN	Mula: 12.8.2024 Siap: 21.10.2024	246,824.00	60%	

BP.I (SENARAI 6/2024)

- Diterima pada 28 Jun 2024
- Sebanyak **2 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM720,000.00**

BP.1 (SENARAI 6/2024), 28.06.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	MENAIKTARAF LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI PEKAN NILAI	Mula: 11.09.2024 Siap: 04.12.2024	670,880.00	35%	
2.	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN MEGA KANAK-KANAK DI TAMAN TASIK SEREMBAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (MALA)	Mula: 05.08.2024 Siap: 26.08.2024	20,000.00	100%	100%

BP.I (SENARAI 7/2024)

- Diterima pada 25 Julai 2024
- Sebanyak **2 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM978,000.00**

BP.1 (SENARAI 7/2024), 25.07.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	PEMBINAAN LALUAN PEJALAN KAKI BAGI TUJUAN REKREASI DI PEKAN MANTIN, MB SEREMBAN	Mula: 11.11.2024 Siap: 24.03.2025	460,160.00	0%
2.	MENAIK TARAF PERANGKAP MINYAK DI PREMIS MAKANAN DI KAWASAN MB SEREMBAN	Mula: 31.10.2024 Siap 26.12.2024	299,900.00	0%

BP.I (SENARAI 8/2024)

- Diterima pada 2 September 2024
- Sebanyak **5 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM950,000.00**

BP.1 (SENARAI 8/2024), 02.09.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	MENYELENGGARA DAN MEMBAIKPULIH JALAN DAN LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KBRH, KG. BARU RASAH	Mula: 06.11.2024 Siap: 01.01.2024	190,570.00	0%	
2.	MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN MOK SUM, KG. BARU RASAH	Mula: 10.10.2024 Siap: 07.11.2024	50,000.00	100%	
3.	MENYELENGGARA DAN MEMBAIK PULIH LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI TAMAN HAPPY DAN SEKITARNYA, RASAH	Mula: 06.11.2024 Siap: 01.01.2025	97,400.00	0%	
4.	MENYELENGGARA DAN MEMBAIK PULIH LONGKANG DAN JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI KG. CHEDANG, RASAH	Mula: 06.11.2024 Siap: 08.12.2024	99,127.00	0%	
5.	MEMBINA DATARAN MANTIN DI HADAPAN SJKC CHUNG HWA, MANTIN	-	-	Iklan tutup pada 30.10.2024	

BP.I (SENARAI 9/2024)

- Diterima pada 26 September 2024
- Sebanyak **8 projek** dengan peruntukan berjumlah **RM1,400,000.00**

BP.1 (SENARAI 9/2024), 26.09.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MEMBINA BARU DEWAN TERBUKA LAMAN DELFINA, NILAI IMPIAN, MB SEREMBAN	Mula: 12.11.2024 Siap: 04.03.2025	950,040.00	0%
P10 – KEBERSIHAN GERAJ				
2.	CADANGAN PEMBAIKAN LONGKANG DAN SISTEM KUMBAHAN SERTA KERJA BERKAITAN DI BAZAR RAKYAT CEMPAKA, NILAI	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	
3.	CADANGAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI GERAJ TAMAN CASUARINA, NILAI	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	
4.	CADANGAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI MEDAN SELERA TIARA BIZ, SENDAYAN	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	
5.	CADANGAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI BENTENG AMPANGAN, SEREMBAN	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	

BP.1 (SENARAI 9/2024), 26.09.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
6.	CADANGAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN LONGKANG DAN TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS PENJAJA LEE SAM, SEREMBAN	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	
7.	CADANGAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN TANDAS SERTA KERJA BERKAITAN DI GERAJ TAMAN SEREMBAN JAYA, SEREMBAN	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	
8.	CADANGAN MENAIKTARAF LANTAI SERTA KERJA BERKAITAN DI GERAJ PEKAN NILAI	Mula: 13.11.2024 Siap: 25.12.2024	50,000.00	

BP.I (SENARAI 12/2024)

- Diterima pada 18 November 2024
- Sebanyak **1 projek** sahaja; iaitu di Kampung Bahagia, Jiboi, Seremban

BP.1 (SENARAI 12/2024), 18.11.2024

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	CADANGAN MENAIKTARAF LONGKANG MONSUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KG. BAHAGIA, JIBOI, AMPANGAN, NEGERI SEMBILAN			Penyediaan dokumen sebutharga

PROJEK PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU CINA

- Diterima pada 27 Jun 2024
- Sebanyak 1 projek dengan peruntukan berjumlah **RM193,458.00**

PROJEK PEMBANGUNAN KAMPUNG BARU CINA, 27.06.2024

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	KERJA-KERJA MENAIKTARAF LONGKANG DAN JALAN DI KAMPUNG BARU BROGA, NEGERI SEMBILAN	Mula: 11.09.2024 Siap: 04.12.2024	193,458.0 0	90%	



UPEN

P.62

PERUNTUKAN P.62 (PELANCONGAN)

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	Kerja-kerja membina laluan pejalan kaki di sekitar bulatan Istana dan laluan berkaitan di daerah Seremban	Mula: 09.07.2024 Siap: 01.10.2024 EOT: 01.12.2024	463,590.00	50%	



BKT

PERUNTUKAN BKT

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
PEMASANGAN PERANGKAP SAMPAH (GROSS POLLUTANT TRAP – GPT)					
1.	Longkang monsoon Taman Desa Indah Bandar Baru Nilai	Mula: 01.10.2024 Siap: 24.12.2024	349,812.00	50%	
2.	Longkang monsoon Taman Matahari Height Bandar Senawang	Mula: 06.09.2024 Siap: 01.11.2024	87,032.50	20%	
3.	Pasar Sementara Taman Semarak Bandar Baru Nilai	Mula: 01.10.2024 Siap: 24.12.2024	474,171.00	30%	
PERUNTUKAN DITERIMA PADA 1.7.2024					
1.	Membekal dan memasang pagar dan lain-lain kerja berkaitan yang diperlukan di tapak pengumpulan anjing terbiar di Lenggeng	Mula: 11.09.2024 Siap: 06.11.2024	60,150.00	100%	



PPN

PERUNTUKAN BAGI PROJEK INFRASTRUKTUR MADANI (PRISMA) NEGERI SEMBILAN FASA 2

BI L	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	Kerja-kerja membaikpulih cerun di Labu Jaya dan kerja-kerja berkaitan	Mula: 08.08.2024 Siap: 28.11.2024	296,900.0 0	40%	



MBS

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
1.	Ubahsuai Wisma MBS – Bilik Pemandu dan Stor UTLK	281020 JKJ	Mula: 19.07.2024 Siap: 08.11.2024	95,875.00	100%	100%
2.	Ubahsuai pondok pengawal keselamatan di Unit Bengkel & Pengangkutan	281020 JKJ	Mula: 06.11.2024 Siap: 26.02.2024	73,800.00	0%	
3.	Kerja-kerja penyelenggaraan Medan Selera Taman Desa Rhu	281060 JKJ	Mula: 22.07.2024 Siap: 13.10.2024	237,500.00	100%	
4.	Pembaikan dan pemasangan bumbung di Bazaar Rakyat Desa Cempaka	281060 JKJ	Mula: 05.06.2024 Siap: 28.08.2024	101,850.00	100%	100%
5.	Kerja membaikpulihan sistem perpaipan di Gerai Tapak 1 Senawang	281090 JP	Mula: 02.09.2024 Siap: 16.12.2024	92,500.00	Tajuk baru: Kerja-kerja mengganti tangka septik serta kerja-kerja berkaitan di gerai hak milik MBS, NSDK 100%	
6.	Kerja-kerja membina tangki septik di Gerai Batu 2 ½, Jalan Seremban – Kuala Pilah	281090 JP				
7.	Cadangan kerja-kerja penyelenggaraan mural-mural yang lusuh dan kerja-kerja berkaitan di	281990 JKJ	Mula: 26.02.2024 Siap: 01.03.2024	177,780.00	100%	100%

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
8.	Cadangan membaikpulih gerbang sediada yang telah uzur dan kerja-kerja berkaitan di laluan masuk ke bandar Seremban	281990 JKB	Mula: 24.05.2024 Siap: 25.10.2024 EOT 1: 11.10.2024 EOT 2: 25.10.2024	463,225.00	100%	32%
9.	Kajian Profil Pelepasan Karbon Seremban (<i>Carbon Emission Profile</i>)	381990 JPP	-	-	Dijangka iklan Jun 2024	
10.	Pelan Pembangunan dan Strategik Pelancongan Seremban Tahun 2024 - 2029	381990 JPMP			Dijangka iklan Mac 2024	
11.	Pembinaan Jalan Merbok 10, Taman Bunga Blossom	331010 JKJ	Mula: 15.04.2024 Siap: 10.06.2024	145,010.00	100%	100%
12.	Kerja membina jalan dan menurap semula tempat meletak kenderaan di Gerai Taman Semarak, Nilai	331010 JKJ	Mula: 02.01.2024 Siap: 27.02.2024	185,000.00	- Siap (Peruntukan KPKT (BP.1)) - Dipindahkan untuk bayaran kerja-kerja pembinaan tangki air bagi gerai di Taman Coral Height	100%

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
13.	Menaiktaraf lampu jalan HPSV sedia ada kepada lampu jenis LED di kawasan MBS Zon Seremban	331070 JKJ	Mula: 23.09.2024 Siap: 02.12.2024	142,000.00	70%	
14.	Penyelenggaraan lampu limpah stadium-stadium MBS	331070 JKJ	Mula: 23.09.2024 Siap: 02.12.2024	234,600.00	50%	
15.	Menaiktaraf lampu jalan HPSV sedia ada kepada lampu jenis LED di kawasan MBS Zon Nilai	331070 JKJ	Mula: 07.08.2024 Siap: 04.09.2024	49,707.88	100%	100%
16.	Sistem lampu isyarat di Jalan Bukit Chedang	331070 JKJ	Mula: 23.09.2024 Siap: 16.12.2024	267,500.00	50%	
17.	Kerja-kerja membina longkang serta lain-lain kerja yang berkaitan di Kg. Singh, Seremban	331090 JKJ	-	-	- Telah dilaksanakan melalui Peruntukan IKR - Dipindahkan untuk bayaran kerja-kerja pembinaan tangki air bagi gerai di Taman Gerai	

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
18.	Kerja-kerja menaiktaraf sistem perparitan di Taman Sri Mawar	331090 JKJ	Mula: 29.05.2024 Siap: 19.08.2024	98,540.00	100%	100%
19.	Kerja-kerja menaiktaraf sistem perparitan di Taman Permai	331090 JKJ	Mula: 26.06.2024 Siap: 21.08.2024	92,295.00	100%	
20.	Membina gerai penjaja di Taman Telawi Tukar lokasi ke Gerai E-Kasih Taman Ampangan	321060 JKJ	-	-	Penyediaan dokumen sebutharga	
21.	Cadangan kerja-kerja menaiktaraf lampu kawassan kepada lampu solar serta kerja yang berkaitan di gerai Casuarina, Bandar Baru Nilai, NSDK.	321060 JKJ	Mula: 06.05.2024 Siap 07.07.2024	109,566.00	100%	100%
22.	Kerja-kerja membina pusat komuniti serta kerja berkaitan di Taman Kemuning	321050 JKJ	Mula: 15.04.2024 Siap: 05.08.2024 EOT: 24.09.2024	291,480.00	100%	dalam proses bayaran
23.	Kerja-kerja membina pusat komuniti serta kerja berkaitan di Taman Sri Pulai	321050 JKJ	Mula: 22.07.2024 Siap: 10.11.2024 EOT 1: 10.12.2024	290,050.00	60%	

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
24.	Kerja membina dan menyiapkan sebuah pusat komuniti di Taman Tiara Sendayan	321050 JKJ	-	-	Disalurkan untuk projek membina dewan di Sendayan	
25.	Membina dan menaiktaraf taman permainan kanak-kanak / alatan senaman di dalam kawasan MBS - Cadangan kerja-kerja menaiktaraf kemudahan riadah serta berkaitan di Dataran Nilai, sebahagian mukim Bandar Nilai Utama, kawasan MBS, daerah Seremban, NSDK	331100 JTL	Mula: 20.05.2024 Siap: 14.07.2024	254,630.00	100%	
26.	Membina dan menaiktaraf gelanggang futsal di dalam kawasan MBS - Taman Sri Ramal, Rantau	331100 JTL	Mula: 04.11.2024 Siap: 16.12.2024	-	10%	
27.	Naiktaraf tandas dan bilik persalinan di STAR, Paroi	331100 JPMP	Mula: 04.11.2024 Siap: 02.12.2024	-	10%	
28.	Membaiki permukaan <i>tiles</i> 3 kolam renang (dewasa, wanita & kanak-kanak) di Kolam Renang Awam, Paroi	331100 JPMP	-	-	Dipindahkan ke vot 321040 bagi kerja penurapan	
29.	<i>Waterproofing</i> tandas lelaki dan wanita di Kolam Renang Awam, Paroi	331100 JPMP	-	-	Setor Sitaan JUUP (Galla)	
	Kerja-kerja menaiktaraf landskap (median)					

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
31.	Cadangan menaiktaraf landskap serta kerja-kerja berkaitan di Persiaran Perbandaran, Bandar Baru Nilai di dalam MBS	331990 JTL	-	-	Dijangka iklan Julai 2024	
32.	Kerja-kerja mural di bandar Seremban	331990 JPMP			Penyediaan dokumen sebutharga	
33.	Membina 5 tempat simpanan barang berpagar di Setor Sitaan JUUP (Galla)	321040 JKJ	Mula: 25.09.2024 Siap: 18.12.2024	448,580.00	10%	
34.	Membina gudang simpanan di Setor Sitaan JUUP (Galla)	321040 JKJ				
35.	Cadangan ubahan tambahan ruang perkhidmatan dan penyelenggaraan terbuka kepada ruang rehat dan riadah berbumbung jenis "Alfresco" serta kerja-kerja berkaitan di Tingkat Satu, Wisma MBS Tukar Tajuk: Cadangan Tambahan Dan Ubahsuai Kepada Jabatan Penyelenggaraan Dan Jabatan Kesihatan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Wisma Majlis Bandaraya Seremban, Seremban	322020 JKB	Mula: 19.07.2024 Siap: 08.11.2024	207,810.00	50%	
36.	Pemasangan talian <i>backup</i> pejabat cawangan dan penggantian perkakasan sistem rangkaian	391010 JTMK	Mula: 01.09.2024 Siap: 31.08.2027	473,743.12	Dalam pelaksanaan	-

PERUNTUKAN MBS

BIL	TAJUK	VOT & JABATAN KAWALAN	MULA/SIA P	KOS (RM)	STATUS PROJEK	STATUS BAYARAN
37.	Pembangunan sistem emel bil	391020 JTMK	-	-	Dalam proses lantikan vendor	-
38.	Penilaian semula	381030 JPPH	-	-	Projek sedang dilaksanakan	



PROJEK 2023



MARRIS

SENARAI KERJA **TENDER** (kelulusan 19.4.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT BATANG BENAR, MANTIN, NSDK	Mula: 18.12.2023 Siap: 03.06.2024 EOT 1: 23.09.2024	4,888,750.00	89%
2.	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN ARAB MALAYSIAN, NILAI, NSDK	Mula: 18.12.2023 Siap: 29.04.2024 EOT 1: 22.07.2024 EOT 2: 11.11.2024	5,504,640.00	85%

1. CADANGAN KERJA-KERJA PEMBAIKAN CERUN SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI RUMAH RAKYAT BATANG BENAR, MANTIN, NSDK


SEMASA



SEMASA



SEMASA

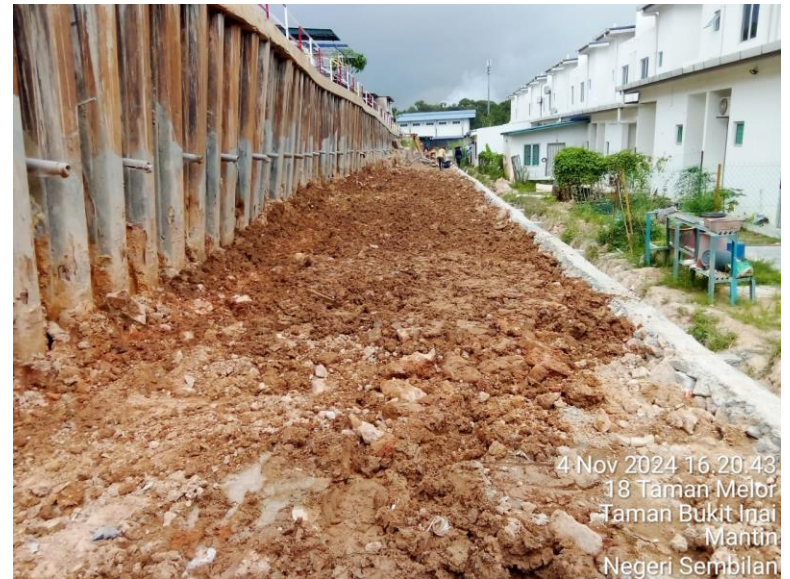

2. CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LONGKANG SERTA KERJA YANG BERKAITAN DI KAWASAN PERINDUSTRIAN ARAB MALAYSIAN, NILAI, NSDK

SEMASA



SEMASA



SENARAI KERJA **SEBUTHARGA** (kelulusan 19.4.2023)

BIL.	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS (%)
1.	KERJA-KERJA PENGUKUHAN CERUN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN WARISAN PUTERI A40, TAMAN WARISAN PUTERI, SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS	-	-	Rundingan harga
2.	MENURAP SEMULA JALAN DAN MEMBAIKPULIH TEMBOK SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI DESA KIARA INDAH, SEREMBAN	Mula: 2.9.2024 Siap: 16.2.2025	400,000.00	20%

LANTIKAN TERUS, SEBUTHARGA, TENDER

MESY MARRIS BIL. 2/2023, 26.10.2023

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS (%)
SEBUTHARGA				
1	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN KILAT 2, SEREMBAN	Mula: 27.5.2024 Siap: 16.9.2024	486,960.00	90%
2	CADANGAN KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH CERUN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PAROI JAYA, SEREMBAN	Mula: 28.8.2024 Siap: 14.1.2025	498,610.00	75%
TENDER				
1	KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH RUNTUHAN CERUN DI TAMAN CHIP AIK, SEREMBAN DAN LAIN- LAIN KERJA BERKAITAN	Mula: 1.7.2024 Siap: 17.2.2025	2,980,000.00	10%
2	CADANGAN PEMBAIKAN CERUN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN NURI INDAH 3, RASAH, NEGERI SEMBILAN.	-	-	Mesyuarat telah bersidang pada 5.11.2024




KPKT

SENARAI TPPM TAHUN 2023

(kelulusan 05.05.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Kerja-kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pangsapuri Cempaka Court, Taman Desa Cempaka	Mula: 12.07.2023 Siap: 01.11.2023 EOT: 08.02.2024 LAD: 09.02.2024	489,100.00	3% (Kontraktor telah ditamatkan. Akan panggil sebutharga semula)
		Lantikan Kontraktor Baru Mula: 09.09.2024 Siap: 02.12.2024	485,000.00	70%

Kerja-kerja Penggantian Satu (1) Unit Lif Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pangsapuri Cempaka Court, Taman Desa Cempaka

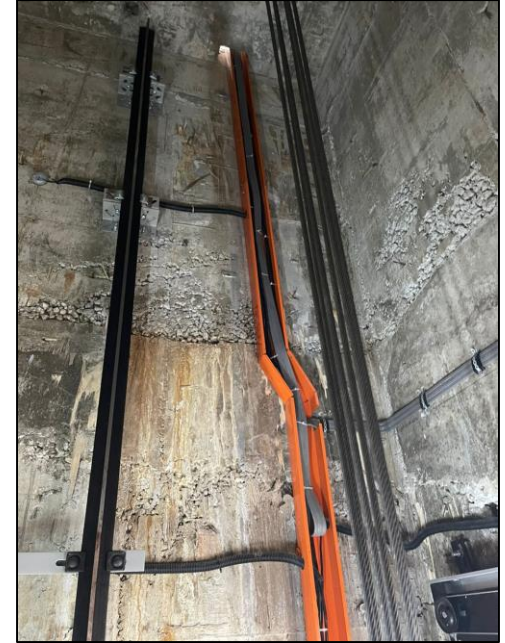

SENARAI 8/2023

(kelulusan 22.5.2023)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Membaikpulih Kerosakan Am Serta Kerja-Kerja Berkaitan di Kompleks Penjaja Jalan Lee Sam, MB Seremban	Mula: 3.7.2023 Siap: 22.10.2023 LAD: 23.10.2023	778,160.00	85%

RMK-12: MEMBAIKPULIH DAN KERJA PENGUKUHAN CERUN DI KAWASAN PBT

Kelulusan 23.10.2023

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1	Cadangan pembaikan cerun di Taman Bukit Sentosa, Seremban	-	-	Pelantikan perunding
2	Cadangan pembaikan cerun di Taman Bukit Intan, Seremban	Mula: 27.03.2024 Siap: 10.09.2024 EOT 1: 30.10.2024 EOT 2: 11.12.2024	1,179,060.00	80%



**INISIATIF KEMUDAHAN
RAKYAT (IKR) –
RM 4,620,000.00**

INISIATIF KEMUDAHAN RAKYAT (IKR)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS(%)
1.	KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH TEMPAT PENONTON DI LITAR GOKART SEREMBAN	-	-	Perincian semula skop kerja
2.	KERJA-KERJA MEMBAIKI PADANG DI TAMAN PAROI JAYA	Mula: 1.7.2024 Siap: 26.8.2024	180,000.00	95%
3.	KERJA-KERJA PEMBAIKAN AM DI STADIUM HOKI DATO' HAJI MOHD SAID, SEREMBAN 2	-	-	Perincian semula skop kerja
4.	KERJA-KERJA MENAIKTARAF TAMAN PERMAINAN DAN PADANG BOLA DI TAMAN DESA RHU SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DALAM KAWASAN MBS	-	-	Penyediaan dokumen sebutharga



SAMBUNGAN PROJEK 2022



PROJEK MARRIS 2022

SENARAI PROJEK MARRIS SIRI 3/2022

TENDER LANTIKAN TERUS (NRSB) / TENDER TERBUKA

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1	MENURAP JALAN DAN MENYELENGGARA JAMBATAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN TOK DAGANG, SEREMBAN	-	-	Dalam tindakan jurutera perunding
2	MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG, SEREMBAN	Mula: 11.12.2023 Siap: 8.7.2024 EOT 1: 8.10.2024 EOT 2: 6.1.2025	3,839,523.00	40%
3	MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN INDUSTRI TASIK JAYA, SEREMBAN	Mula: 11.12.2023 Siap: 27.5.2024 EOT 1: 15.8.2024 EOT 2: 20.9.2024	1,139,950.00	95%
4	CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN PETRONAS JALAN JELEBU, SEREMBAN	Mula: 11.12.2023 Siap: 1.4.2024 EOT 1: 3.6.2024 EOT 2: 12.8.2024 EOT 3: 30.10.2024	582,077.00	70%

MENURAP SEMULA JALAN DAN MENYELENGGARA LONGKANG SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN TEMIANG, SEREMBAN



MEMBAIKPULIH LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN INDUSTRI TASIK JAYA, SEREMBAN




CADANGAN MENYELENGGARA LONGKANG DAN MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN BERHAMPIRAN PETRONAS JALAN JELEBU, SEREMBAN



SENARAI PROJEK MARRIS KERJA TENDER

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	KOS (RM)	STATUS PROJEK
1.	MEMBAIKPULIH PEMBENTUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN WARISAN PUTERI, BANDAR WARISAN PUTERI, SIKAMAT, SEREMBAN.	Mula: 3.7.2023 Siap: 18.12.2023 EOT 1 – 20.3.2024 EOT 2 – 21.6.2024 EOT 3 – 21.9.2024	788,500.00	60%

MEMBAIKPULIH PEMBENTUNG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LORONG BELAKANG JALAN WARISAN PUTERI, BANDAR WARISAN PUTERI, SIKAMAT, SEREMBAN

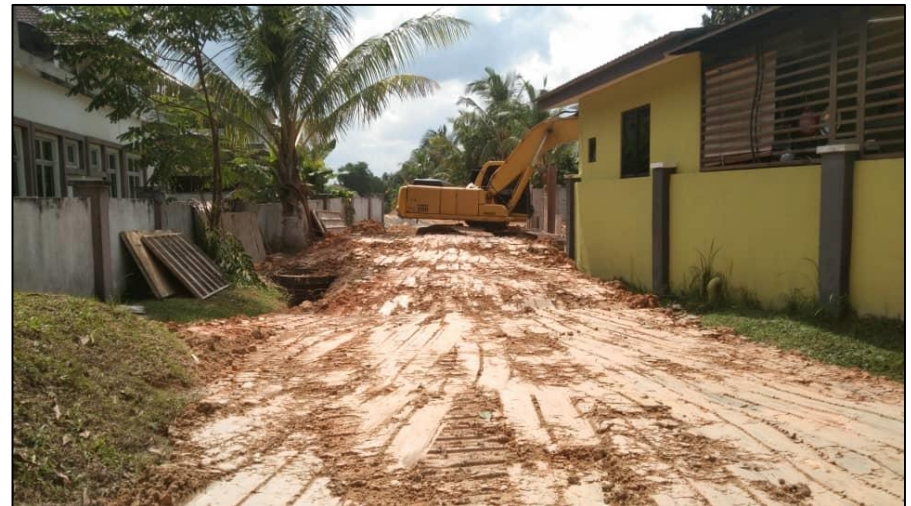




PROJEK SAMBUNG 2021

SENARAI PROJEK 2020

BIL	TAJUK	STATUS
1	PEMBINAAN KOMPLEKS KOMUNITI AMPANGAN, NEGERI SEMBILAN. (PERUNTUKAN MEA) Nota baki kerja: - Kerja sambungan IWK - Premix • Pihak kontraktor telah masuk ke tapak semula • Kerja korekan akan dimulakan setelah tangki septik sampai ke tapak • Kerja perobohan rumah akan dilaksanakan oleh pihak kontraktor	Kos Projek: RM3,520,800.00 Tarikh Mula: 5.4.2021 Tarikh Siap: 4.4.2022 EOT No. 1 – 5.9.2022 EOT No. 2 – 4.3.2023 EOT No. 3 – 3.5.2023 EOT No. 4 – 29.11.2023 Kemajuan: Jadual: 100% Sebenar: 90%

PEMBINAAN KOMPLEKS KOMUNITI AMPANGAN, NEGERI SEMBILAN

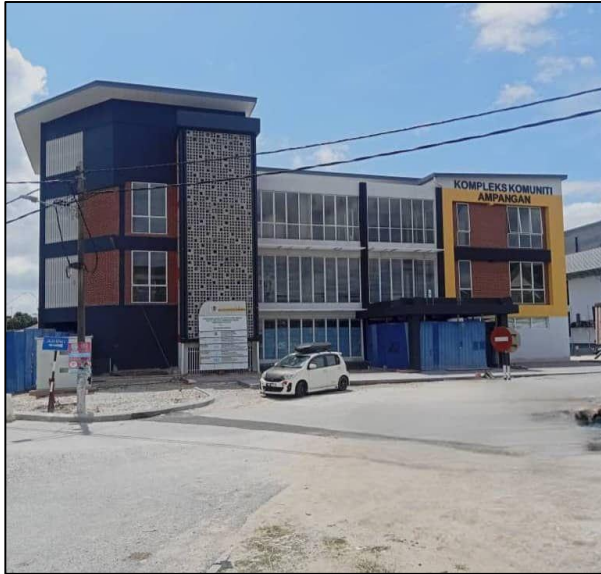

SENARAI PROJEK 2021 (MARRIS)

BIL	TAJUK	MULA/SIAP	STATUS(%)	DUN
1	Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK	Mula: 06.09.2021 Siap: 05.03.2023 EOT 1: 05.01.2024 EOT 2: 06.05.2024 EOT 3: 18.11.2024	88% 15,100,000.00	PAROI
2	Menyelenggara longkang, jambatan dan yang berkaitan di Jalan Persiaran Desa Rhu 1, Taman Desa Rhu, Sikamat, Seremban	Mula: 29.8.2022 Siap: 28.8.2023 EOT 1: 27.8.2024 EOT 2: 28.8.2025	30% RM 2,468,875.00 Permohonan peruntukan tambahan bagi kerja-kerja pengalihan utiliti	SIKAMAT

2.

Cadangan kerja-kerja membaikpulih dan penyelenggaraan jambatan serta kerja yang berkaitan di Taman Tuanku Jaafar, Seremban , NSDK

SEBELUM



SEMASA



SEMASA




SEMASA



SEMASA



SEMASA

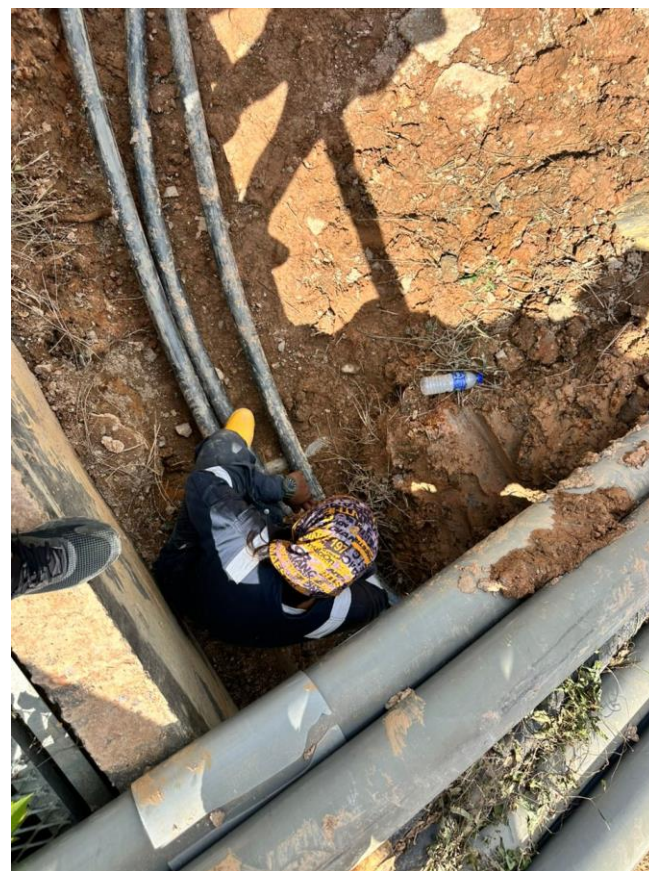

SEMASA



SEMASA





TERIMA KASIH
